

現場レポート 東九州自動車道

・北九州空港



① 光国トンネル工事
工事会社: ㈱フジタ
提地区

平成24年1月12日にトンネルの掘削を開始しました。まだ3割程しか掘り進んでいないですが、来年1月の貫通を目指しています。

③ 新津トンネル工事
工事会社: 飛鳥建設㈱
下片島地区

本線の工事も完了に向けて仕上げの作業を行っています。

② 南原トンネル工事
工事会社: 戸田建設㈱
集地区

現在、高速道路を土石流災害から守るための堤防工事を行っています。

④ 小波瀬川橋(鋼上部工)工事
工事会社: ㈱東京鐵骨橋梁
雨窪地区

上道池の中の下部工施工が完了し、夏からは、橋を架ける工事を開始します。

⑤ 延永工事
工事会社: 戸田建設㈱
上片島地区

土を盛る工事を行っています。工事も終盤に近づき、高速道路の形がだいぶ見えてきました。

⑨ 泉工事
工事会社: 戸田建設㈱
泉地区

土を盛る工事を行っています。少しずつ高速道路の形が見えてきました。

⑥ 長峽川橋(鋼上部工)工事
工事会社: ㈱サクラダ
吉国地区

長峽川に橋桁を架けてコンクリートの床版や壁高欄などの工事を行い、仕上げに取り掛かっている状況です。

⑩ 祓川橋(PC上部工)工事
工事会社: 川田建設㈱
有久・皆見地区

祓川に一部橋桁が架かりました。引き続き、橋梁の架設工事を進めていきます。

⑦ 稗田工事
工事会社: オリエンタル白石㈱・松鶴建設㈱JV
下検地区

橋梁下部工や、横断BOX等の構造物の工事を行っています。構造物が仕上がったら、土を盛る工事に着手します。

⑪ みやこ工事
工事会社: 奥村組土木興業㈱
皆見地区


橋梁の下部工の工事が終わり、ランプ部や土を盛る工事を行っています。

⑧ 今川工事
工事会社: ㈱フジタ
宝山・流末地区

行橋PA(仮称)が出来る場所に土を盛る工事をしており、現在3割ほど土を盛っています。

行橋PA(仮称)
行橋PA
スマートIC

椎田道路

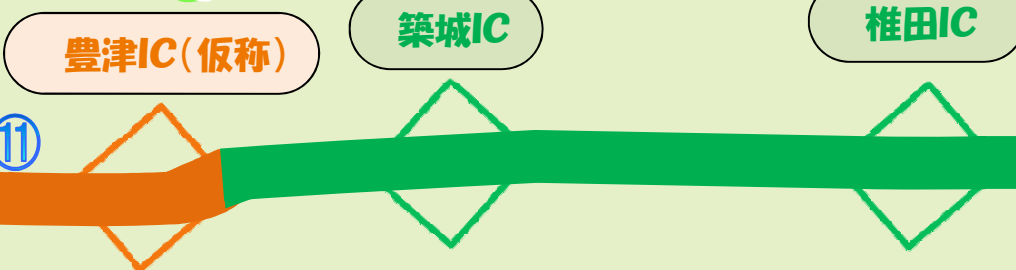

平成24年5月末現在

市町村名	苅田町							行橋市					みやこ町	築上町			
担当工事区	苅田							行橋北		行橋南			みやこ築上				
校区名 地区名	雨窪	提	馬場	南原	集	浄土院	戸早学園	片島	岡崎	延永	稗田	今川	東矢留	泉	祓郷	安武	小原
工事着手	光国トンネル工事		南原トンネル工事		新津トンネル工事			延永工事	吉国工事	吉国工事	稗田工事	今川工事	泉工事		みやこ工事	築城工事	椎田工事
工事進捗率	29.0%		96.1%		98.3%			56.4%	56.4%	14.7%	32.6%	35.0%		46.8%	0%	0%	
