

---

---

## 3. 今後の予定

---

---

# ■平成27年度の検討会および部会のスケジュール



平成27年度の検討会および部会の進め方を以下に示す。




# ■ 工事及び環境モニタリング調査の工程の変更



橋梁設計の検討結果を踏まえ、工事及び環境モニタリング調査の工程を以下の様に変更する。

## ■ 調査スケジュール（※当初 第4回検討会）

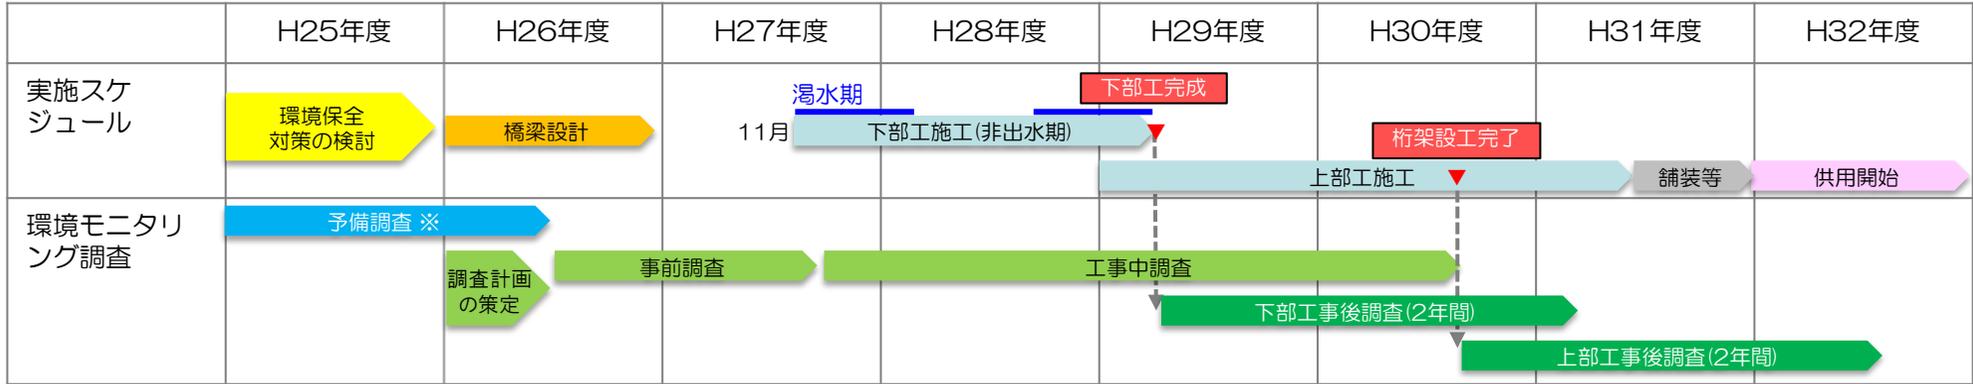

※下部工施工が2濁水期→4濁水期に変更

## ■ 調査スケジュール（※変更）



▲現在



# ■ 検討会及び部会に関する工程の変更



今後のスケジュールを示す。

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
実施スケジュール	環境保全対策の検討	橋梁設計	11月	下部工施工	12月	上部工施工	7月	舗装等	供用開始
環境モニタリング調査	予備調査	計画	事前調査	工事中調査			下部工事後調査(2年間)	上部工事後調査(2年間)	
※鳥類調査：平成25年5月,11月,平成26年1月,3月,4月,5月 底生生物調査：平成25年6月 フジノハナガイ調査：平成26年1月 流向・流速観測：平成25年5月,6月にそれぞれ実施									
検討会・部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H25.8月：検討会の設立趣旨、進め方等</li> <li>■H25.9月：道路構造検討方針の決定</li> <li>■H25.10月：橋梁形式の検討</li> <li>■H25.12月：橋梁形式案に対する環境側面からの評価</li> <li>■H26.1月：環境保全対策(原案)の策定</li> <li>■H26.3月：環境保全対策の決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H26.5月：モニタリング調査計画の策定</li> <li>■H26.8月：モニタリング調査計画の決定、橋梁設計の方針</li> <li>■H26.12月：一般の方々の生物観察データの募集</li> <li>■H27.3月：事前調査(速報)、調査計画のブラッシュアップ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★本日→ ■H27.4月：橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む)</li> <li>■H27.9月頃：事前調査の中間報告、調査計画のブラッシュアップ</li> <li>■H27.10月頃：工事中調査計画の確認 事前調査の中間報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H28.6月頃：事前調査結果の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H29.6月頃：工事中調査結果の報告(H28年度分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H30.6月頃：工事中調査結果の報告(H29年度分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■H31.6月頃：工事中調査結果の報告(H30年度分) 下部工事後調査結果の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事中調査結果の報告(H31年度分)：■H32.6月頃 上・下部工事後調査結果の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上・下部工事後調査結果の報告：H33.6月頃 ■</li> <li>上・下部工事後調査結果の報告：H34.3月頃 ■</li> </ul>
		調査・計画段階		事前調査	工事中調査		工事後調査		

- ：検討会
- ：環境部会
- ：橋梁部会

