
5. 今後の予定

■平成27年度の検討会および部会のスケジュール



平成27年度の検討会および部会の進め方を以下に示す。


	H27.4月	10月	11月	H28.6月頃
検討会	<p>■ 第5回検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁設計の報告 (景観の検討結果を含む) ・ 調査計画のブラッシュアップの中間報告 		<p>■ 第6回検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事前調査結果の報告 (速報) (H26.9~H27.6) ・ 工事中調査計画の確認 	<p>■ 第7回検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事前調査結果の報告 (H26.9~H27.10) ・ 工事中調査結果の報告 (速報) (H27.11~H28.1 予定)
環境部会	<p>■ 第6回環境部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事前調査結果の報告 (速報) (H26.9~H27.6) ・ 事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討 <p>※環境モニタリング調査については適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。</p>			
橋梁部会	<p>※橋梁設計については適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。</p>			

■環境に配慮した工事の実施

←※修正



吉野川渡河橋梁の整備は、これまでの検討会・部会において決定された吉野川渡河部の環境に配慮した橋梁形式に基づき、平成27年度渇水期より施工に着手する。また、本検討会にて承認された「工事中の環境モニタリング調査方法」に従って、工事と合わせて適切に環境監視を行っていく。

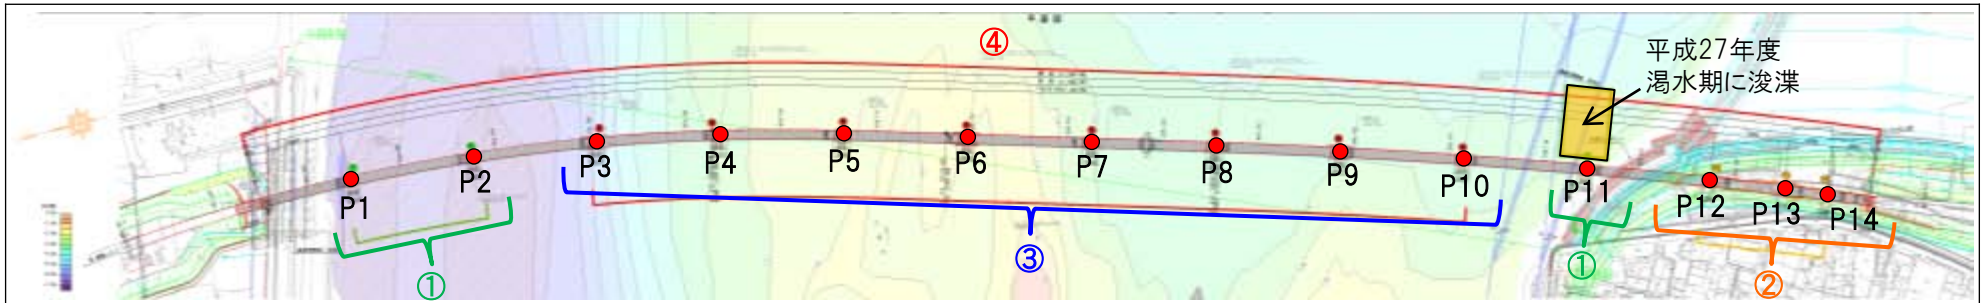

下部工	①について(P1, P2, P11) 平成27年度渇水期より工事着手し、平成28年度渇水期にて完成予定。なお、浚渫作業はP11脚箇所のみ実施する。
	②について(P12, P13, P14) 平成27年度末より順次工事を実施する。
	③について(P3~P10) 平成28年度渇水期から順次工事を実施する。
上部工	④上部工整備 下部工の完成に合わせて順次工事を実施する。

項目	平成27年		平成28年												平成29年					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
下部工	①	準備工		出水期(6月~10月)												準備工				
	②			準備工												準備工				
	③			準備工												準備工				
上部工	④	※下部工の完成に合わせて順次施工																		

