

E55 四国横断自動車道連絡会議(第1回)

議 事 概 要

1. 日 時 : 2018年(平成30年)7月25日(水) 16:00~17:00

2. 出席者 :

四国地方整備局 道路部 道路計画課長

四国地方整備局 道路部 道路工事課長

四国地方整備局 徳島河川国道事務所長

徳島県 県土整備部 高規格道路課長

西日本高速道路株式会社 四国支社 建設事業部長

西日本高速道路株式会社 四国支社 建設事業部 建設統括課長、建設課長

西日本高速道路株式会社 四国支社 徳島工事事務所長

3. 議 事 :

- (1) 四国横断自動車道連絡会議の設置
- (2) 四国横断自動車道の概要
- (3) 四国横断自動車道の進捗状況と課題
- (4) 意見交換

4. 議事概要 :

(事業者より説明)

- 国交省において施工を行っている津田IC(仮称)~徳島東IC(仮称)間については、平成32年度の開通に向けた工事・工事発注手続きを順次進めている。
- NEXCOにおいて施工を行っている徳島東IC(仮称)~徳島JCT間については、平成31年度の開通に向け、工事を行っているが、当初の想定以上に難工事となっていることから、今般、関係機関において工事進捗状況の共有を図ることとした。
- 具体的な課題としては、軟弱地盤対策、埋立地への浸水対策を要している他、吉野川大橋について、
 - ・強風や高波による作業中止の発生
 - ・非出水期毎における河床の浚渫作業の追加
 - ・下部工施工時の杭下部への盤ぶくれ対策工の追加など、当初想定していた以上の厳しい現場条件等に影響を受けているものである。
- これらの課題が工事工程に影響を及ぼす可能性もあるため、引き続き、検証を行っていくこととした。

(意見交換、その他)

徳島県より次のような意見があった。

- 吉野川大橋は厳しい条件での難工事であるとの説明があったが、工事工程への影響については引き続き検証していただき、工事の安全を確保したうえで当初目標の平成31年度内の完成をお願いしたい。
- 県としても事業者と連携し、事業を円滑に進めるために必要な調整、協力を努めてまいる。

以 上

徳島東IC～徳島JCT間 事業進捗概要

平成30年6月末時点

四国横断自動車道




四国横断自動車道(津田～徳島東)進捗状況

180725時点



暫定時に建設する部分	
暫定時に走行する部分	

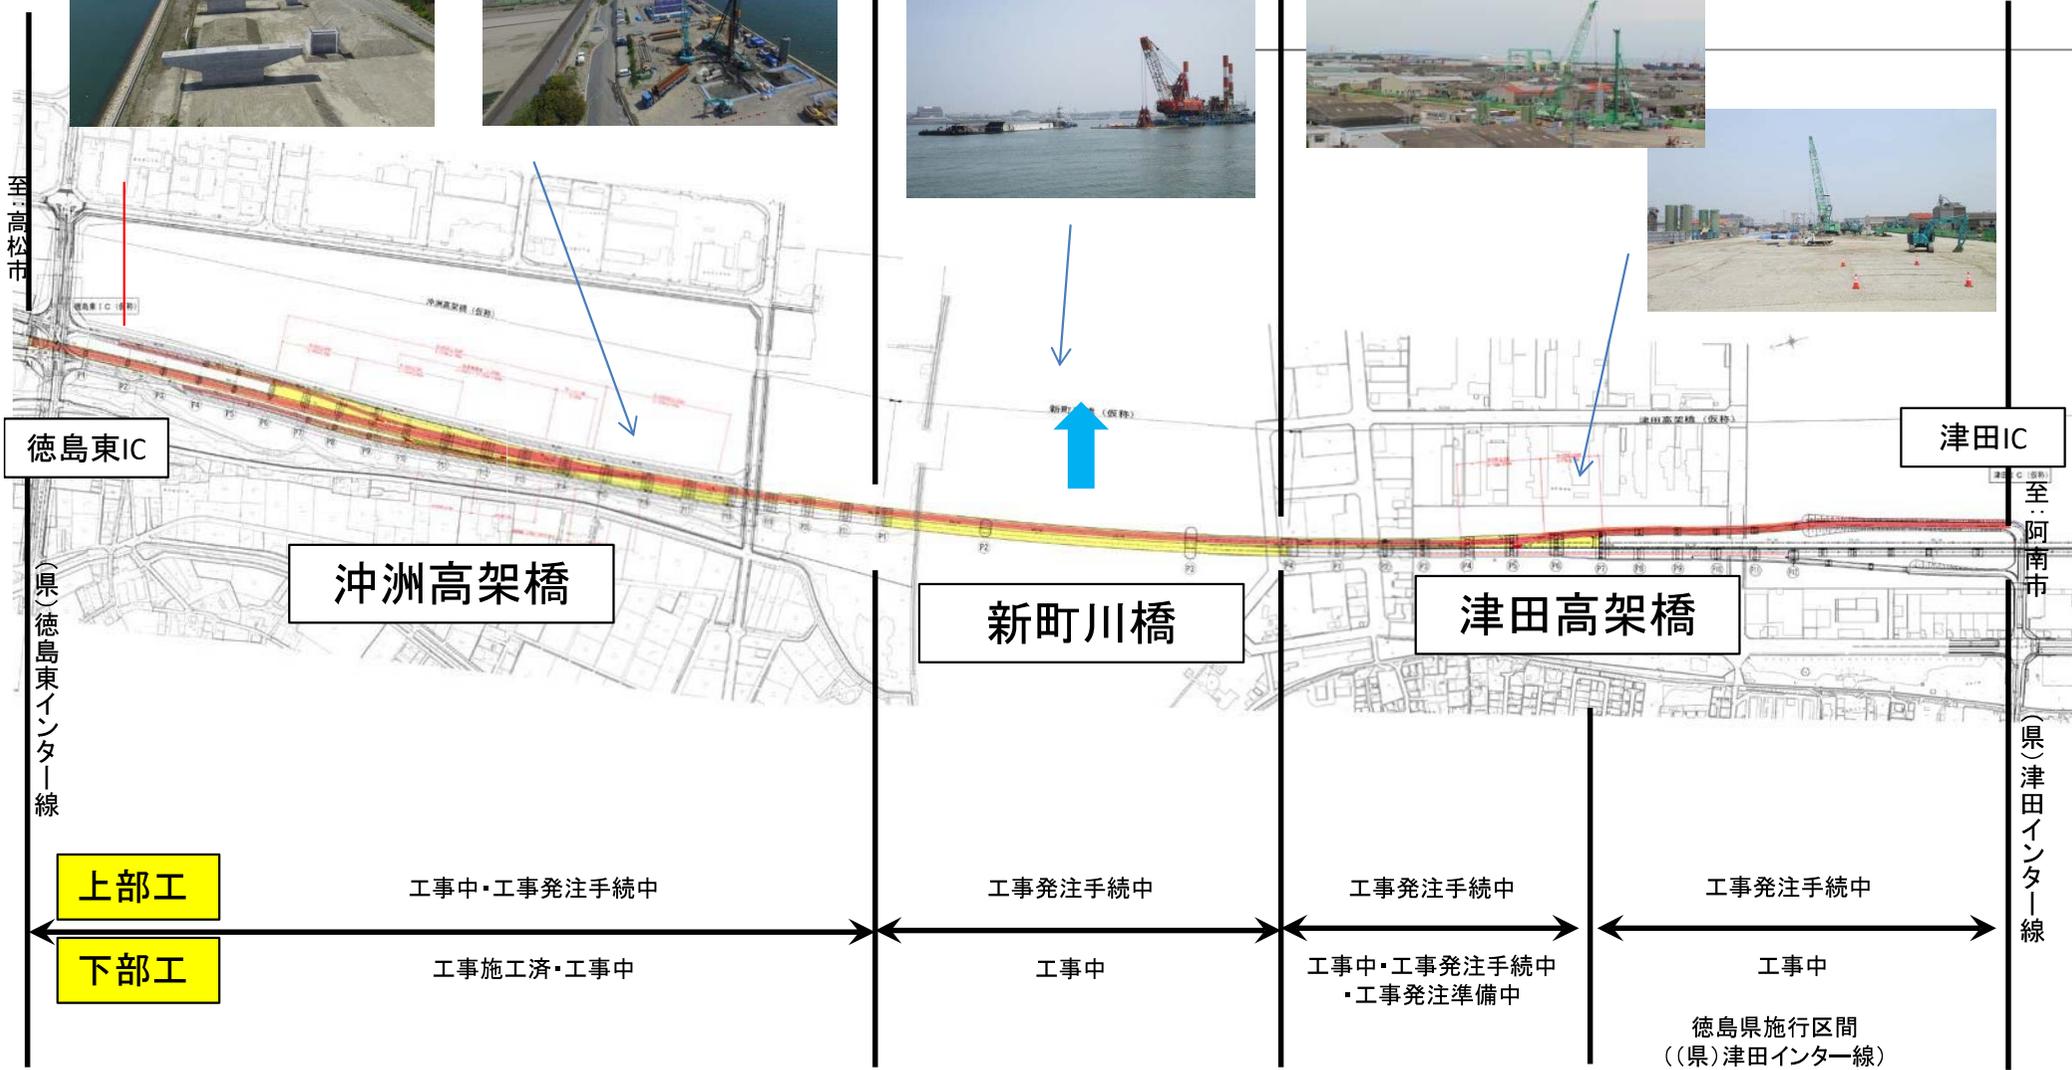

至高松市

徳島東IC

沖洲高架橋

新町川橋

津田高架橋

津田IC

至阿南市

(県)津田インター線

上部工
下部工

工事中・工事発注手続中

工事施工済・工事中

工事発注手続中

工事中

工事発注手続中

工事中・工事発注手続中
・工事発注準備中

工事発注手続中

工事中

徳島県施行区間
((県)津田インター線)
