

新名神高速道路大阪府域 地下水流動対策検討委員会

【資料 1】 事業概要


<目 次>

	頁
・各トンネル等の位置図……………	1 - 1
・進捗状況……………	1 - 2
・各トンネル等の施工の概略工程表……………	1 - 3
・概略地質平面図……………	1 - 4

平成27年3月3日

西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪西事務所

新名神高速道路（大阪府域） 各トンネルの位置図

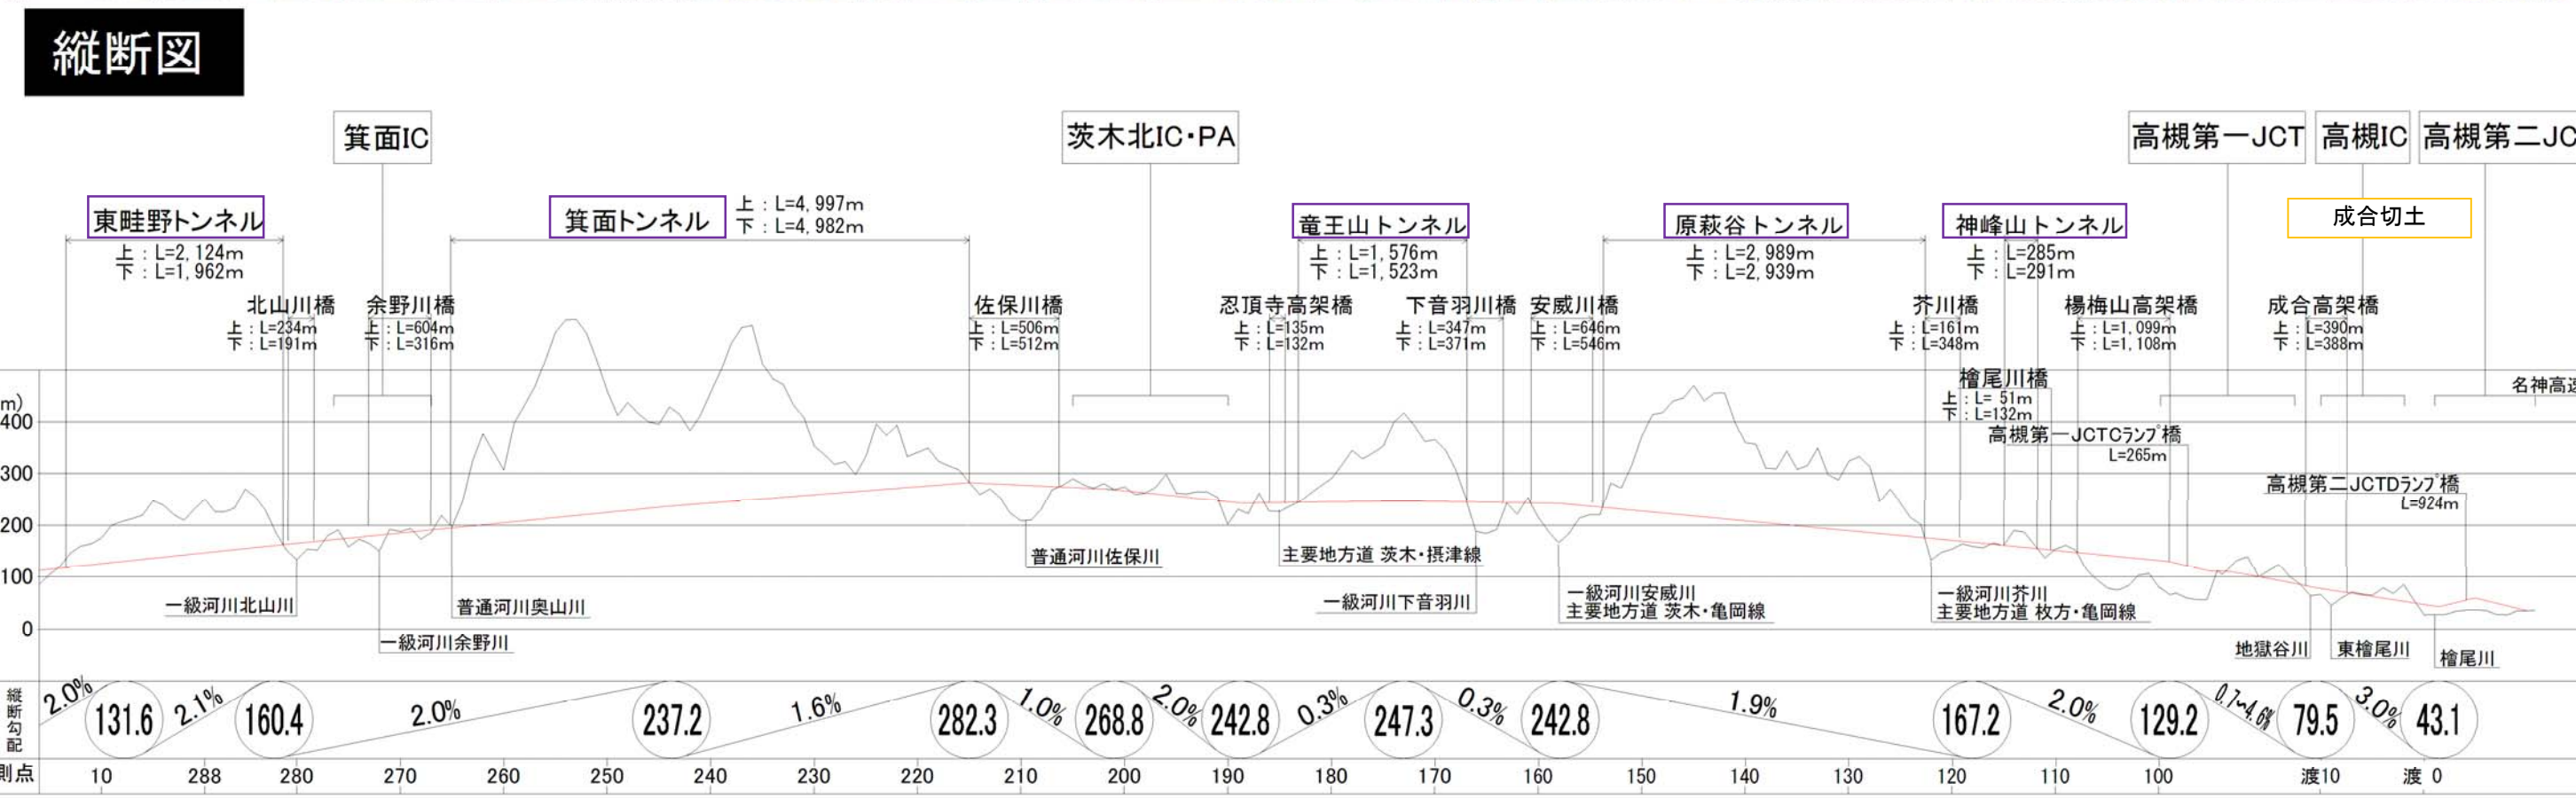

新名神高速道路（大阪府域） 進捗状況

新名神大阪西事務所
H27.2.28現在

市域名	川西市	池田市	箕面市		豊能町	箕面市		茨木市							高槻市（本線）				高槻市（連絡路）						
	(1.7)	(0.3)	(3.9)		(0.4)	(2.4)		(7.0)							(5.5)				(2.5)						
() はkm延長	東 畦野 (1.7)	中川 原町 (0.3)	下止々 呂美 (2.8)	上止々 呂美 (0.4)	箕面 (0.7)	高山 (0.4)	箕面 (1.5)	粟生 間谷 (0.9)	粟生 岩阪 (0.2)	佐保 (1.6)	泉原 (0.2)	千提寺 (1.3)	忍頂寺 (0.3)	安元 (0.7)	忍頂寺 (0.2)	車作 (0.8)	下音羽 (0.8)	車作 (0.9)	萩谷 (1.1)	原 (4.0)	成合 北の町 (0.2)	川久保 (0.2)	成合 (2.3)	宮が谷 等 (0.2)	
路線図 (名称は仮名称)																									
幅杭設置	100%																								
地元協議 【暫定4車】	100%																								
用地取得	99%																								
本線工事	工事用道路 工事																					檜尾川工事 L=1.5km H22.7~ H25.11	楊梅山工 道路工事 L=0.6km H26.12~H27.10		
	工事発注 状況 (予定)		塩川橋 他1橋 工事 H24.7 ~ H28.10	東畦野TN工事 L=2.4km H24.7~H29.1	箕面IC中工事 L=0.8km H26.9~ H29.9	箕面IC工事 L=1.3km H22.11~ H27.5	箕面トンネル 西工事 L=2.9km H24.6~H28.6	箕面トンネル 東工事 L=2.5km H24.4~H28.6	佐保工事 L=0.6km H23.7~H27.4	茨木北IC中工事 L=2.5km H26.11~H29.4	茨木北IC工事 L=1.9km H23.1~H27.6	竜王山トンネル工事 L=1.8km H24.12~H29.3	下音羽工事 L=0.7km H21.9~H26.3	安威川橋(下 部工)工事 L=0.8km H23.9~H27.4	原萩谷トン ネル西工事 L=1.2km H25.8~H28.9	原萩谷トン ネル東工事 L=1.7km H25.4~H28.6	原工事 L=1.3km H23.4~ H27.4	原東工事 L=0.2km H26.11~ H29.10	楊梅山高架 橋(下部工)工事 L=1.0km H24.3~H27.10	高槻IC工事 L=2.4m H23.1~H28.7	高槻JCT T工事 L=0.5km H22.12~ H27.3	高槻JCT 北工事 L=1.6km H25.8~ H28.7			
	本線上部工 工事			北山川橋 (Me) H26.5~ H28.9	箕面ICA2橋 他1橋(PC) H26.8~ H28.12	箕面ICA1橋 他8橋(複合) H26.3~ H29.4	余野川橋 他1橋(Me) H25.1~ H29.1		佐保川橋(PC) H24.12~H28.8		忍頂寺高架 橋他3橋工事 H25.6~H28.1		下音羽川橋 (PC) H23.12~ H27.4	安威川橋(PC) H24.2~ H28.1		芥川橋(PC) H23.8~ H27.10	楊梅山高架 橋(PC) H24.12~ H29.4		成合高架橋他 2橋(PC) H25.3~ H29.3	高槻JCT橋 (Me) H24.4~ H28.6					

: 実施中、実施予定
 : 完了

 : 対象外

