

# 工事進捗状況

※建設中の名称はすべて仮称です



1 城陽JCT・IC



2 宇治田原IC建設予定地から城陽JCT・IC方面



3 府県境から宇治田原第一高架橋方面



4 城陽高架橋から城陽JCT・IC方面



5 富野工事土工と宇治田原第二高架橋

## 『高速道路ができるまで。。。橋梁架設編(送り出し工法) \*表紙写真』


\*JR奈良線上空

送り出し工法とは・・・  
軌条設備上に敷かれたレール上に橋桁を組み立て、自走台車を用いて送り出す工法です。

◆送り出し(1日目)  
手延べ桁を1夜間に到達側の橋脚へ送り出します。

◆送り出し(2日目以降)  
昼間に常設足場を桁に取り付け、設置した延長を夜間で送り出しを行います。その後も同様な作業を繰り返し、全ての桁を送り出します。

本工事では、大型クレーンなどを設置できるスペースが確保できないことから、送り出し工法を採用しています。

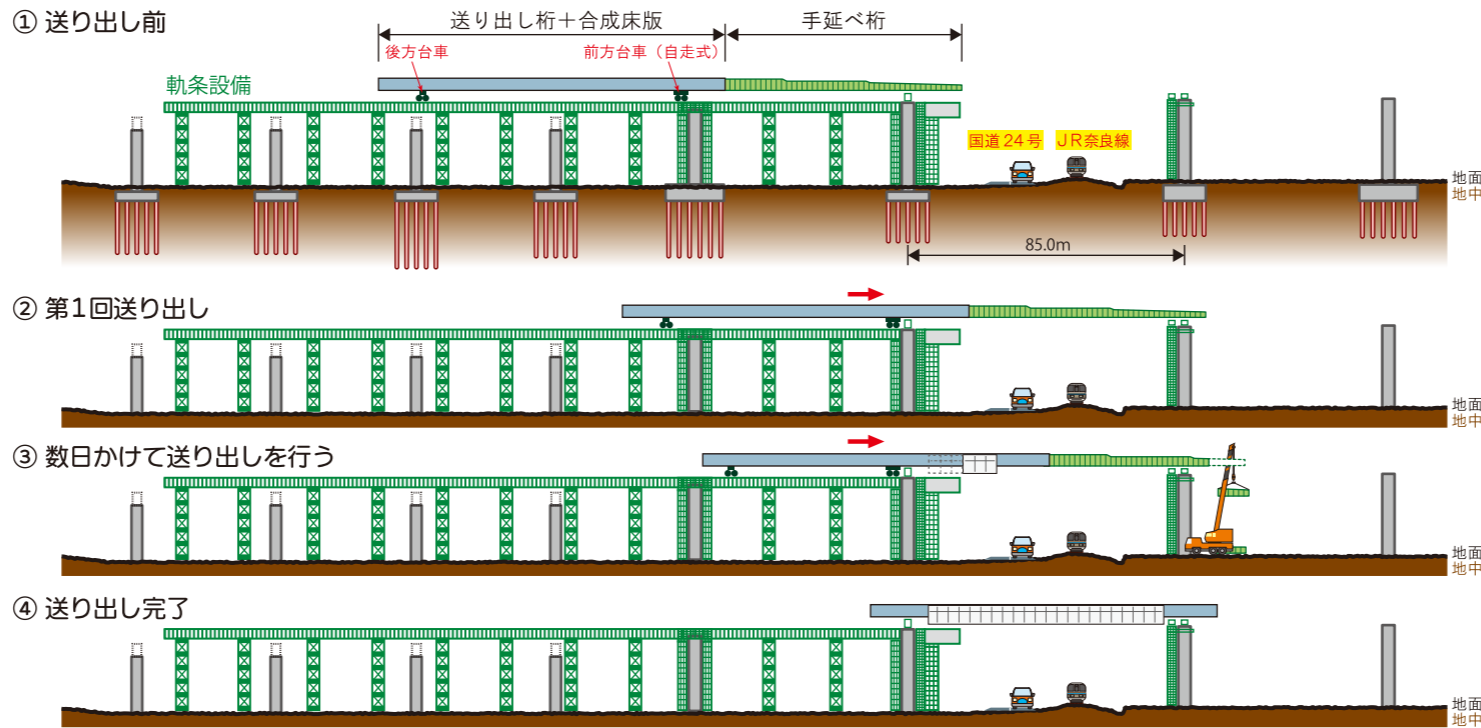

# SHIN-MEISHIN EXPRESSWAY

京都府域 (新名神京都事務所担当区間) 16.4 km

