工事進捗状況

※建設中の名称はすべて仮称です

『高速道路ができるまで…550t吊クレーン2機による府道上の鋼桁リレー架設』＊表紙写真

[1] クレーン1号機で桁ブロック①を吊り上げる。

[2] 桁ブロック①を夜間通行止めをした府道上に仮置きする。



[3] クレーン2号機で、仮置きした桁ブロック①を吊り上げる。クレーン1号機は桁ブロック②を吊り上げる。



[4] 桁ブロック①と②をクレーンで吊り上げた状態で、高所作業車を用いて添接（部材どうしを連結すること）し、架設を完了させる。

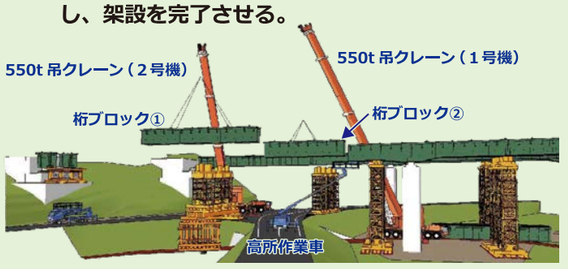

府道783号宇治田原大石東線は交通量が多く、通行止め期間を最小限にするため、夜間通行止めにて府道上空の桁架設を行いました。国内最大級の550ｔ吊クレーンを２台使用し、バトン（鋼桁）を受け渡すように架設する姿から、鋼桁リレー架設と呼んでいます。

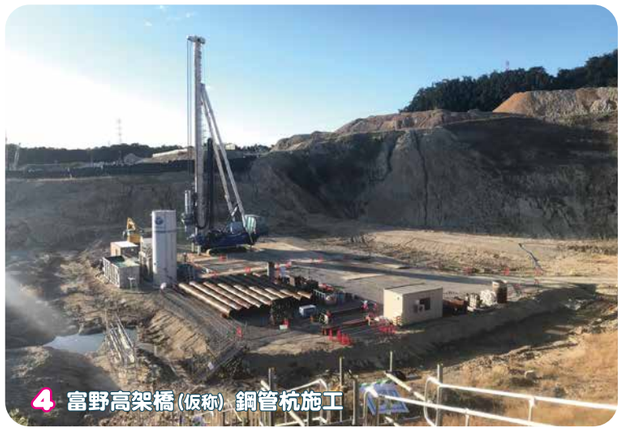

SHIN-MEISHIN EXPRESSWAY
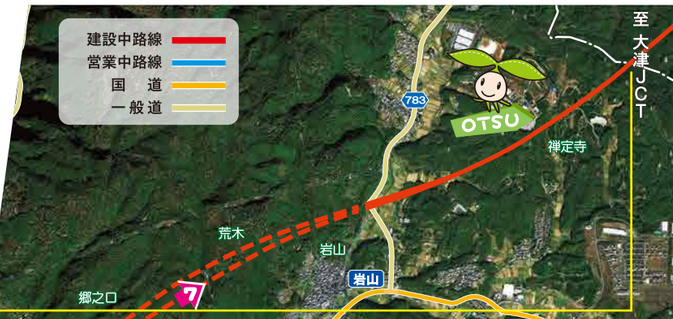
京都府域（新名神京都事務所担当区間） 12.9km
