工事進捗状況

※建設中の名称は
すべて仮称です

1 城陽JCT・ICから城陽高架橋（仮称）

2 城陽第一高架橋（仮称）落とし込み架設

『高速道路ができるまで…府道252号上550t吊クレーンによる架設』

＊表紙写真

【側面図】

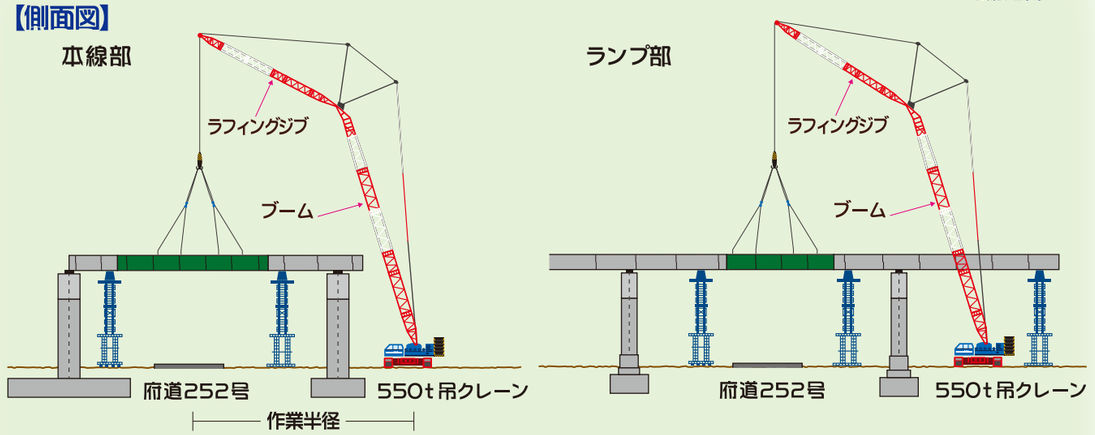

【平面図】

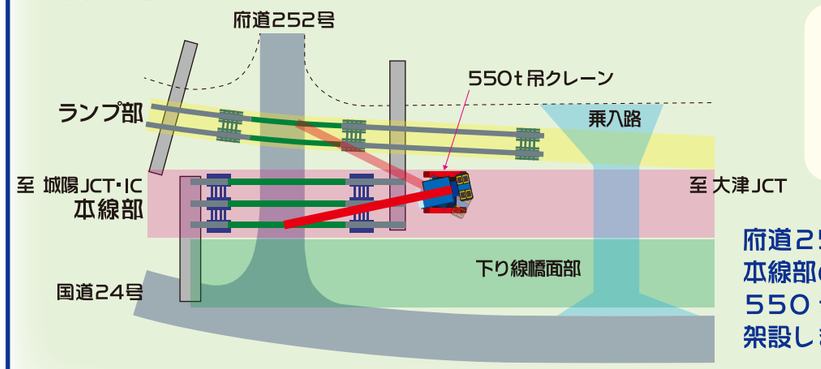

550t吊クレーン仕様
ブーム長：42.5m
ラフィングジブ：27m
作業半径：36m
吊上げ重量：40.5t

府道252号の通行止め規制を行い本線部の上り線とランプ部の橋桁を550t吊クレーンを用いて夜間に架設しました。

3 富野狼谷 地盤改良工

4 城陽スマートIC（仮称）建設予定地付近

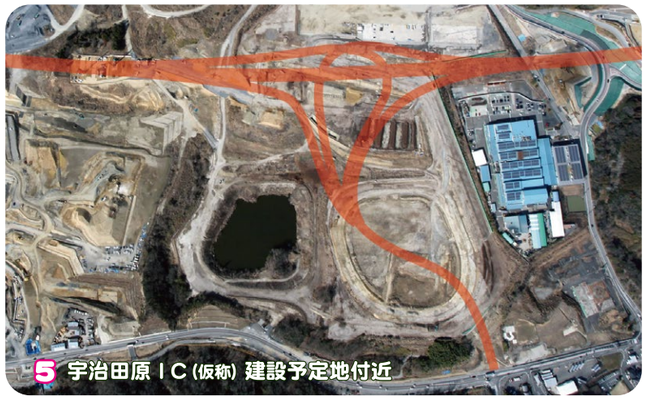
5 宇治田原IC（仮称）建設予定地付近

6 宇治田原トンネル東坑内

7 宇治田原第一高架橋（仮称）

SHIN-MEISHIN EXPRESSWAY

京都府域（新名神京都事務所担当区間） 12.9km
